

ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ ๖๑๕๗๖



ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย โดยปรับปรุงระบบ
น้ำเสียและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

เรียน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด่วนที่สุด ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๓๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามเร่งรัด ความก้าวหน้าโครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย โดยปรับปรุงระบบน้ำเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประติษฐ์จองค์ำ
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการสรุปรายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย โดยปรับปรุงระบบน้ำเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ท่านทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชษฐา โมสิกรัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๑ ต่อ ๓๓

ผู้ประสานงาน นางอุรา สมณา โทร ๐๖ ๔๙๑๗ ๐๕๒๖

รายชื่อแนบท้าย ตามหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๗/๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

๑. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
๔. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย โดยปรับปรุงระบบน้ำเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
ประชุมวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรัฐจองค์ำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑. ประชุม ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย โดยมี นายศรีณัฐ มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานที่ประชุม เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกเทลีส่อมปี ซึ่งต้องดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบกับบ้านรักไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัด ความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดให้มีการประชุมในวันนี้



๒. ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกองค้การบริหารสวนตำบลหมอกจำแป่ ผู้ว่าจ้าง, นายธนาวัฒน์ รุ่งอรุณกิจ ผู้รับจ้าง บริษัท หมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด, ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน, คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, ช่างผู้ควบคุมงาน, เจ้าหน้าที่กองคลัง และเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบต.หมอกจำแป่




๓. นายธนวัฒน์ รุ่งอรุณกิจ ผู้รับจ้าง บริษัท หมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด (เลื้อสไฟฟ้าแขนยาว) ชี้แจงให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และ อบต.หมอกจำแป้ นำโดย นายสมศักดิ์ ณ มาตคำ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป้ พร้อมด้วย นายกิติพนธ์ พรหมแก้ว นายช่างโยธา รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย





สภาพปัจจุบัน อ่างเก็บน้ำ บ้านรักไทย ก่อนดำเนินการ



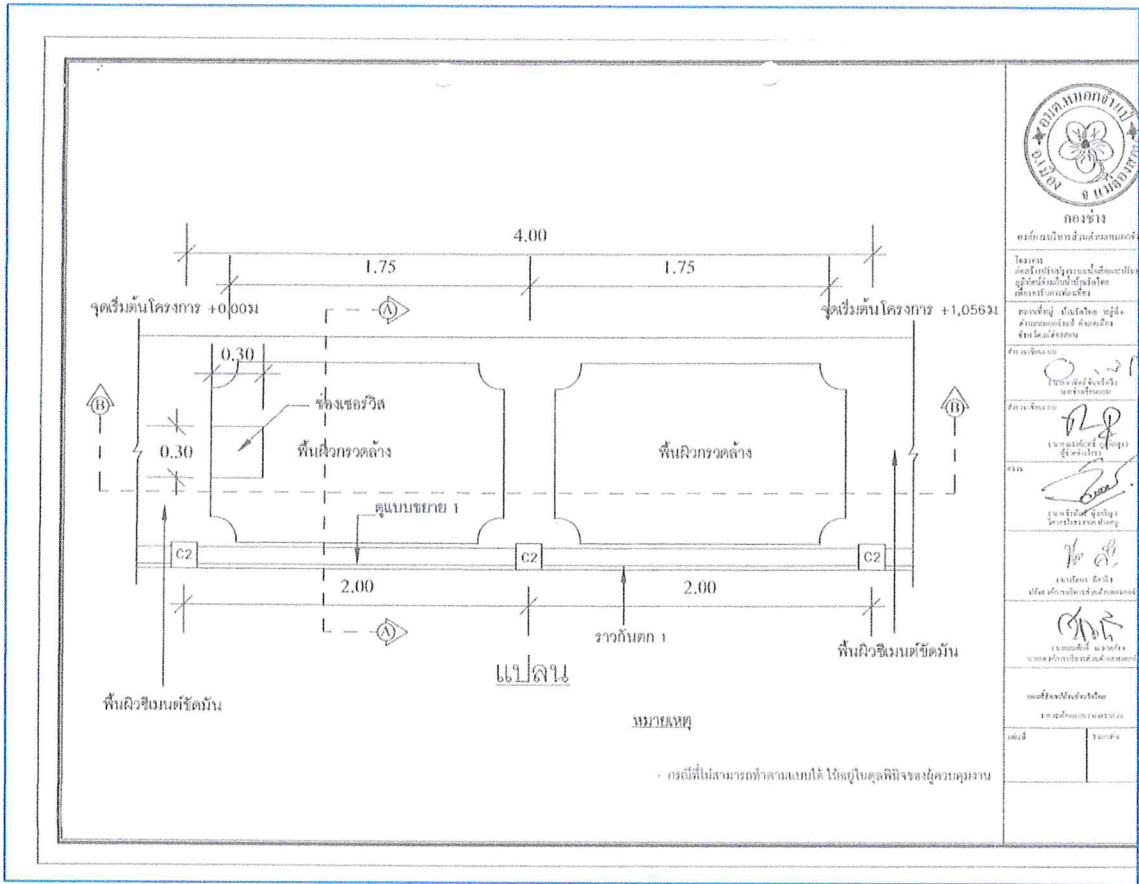

รายงานการประชุม

ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย โดยปรับปรุงระบบน้ำเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมประดิษฐ์ทองคำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายศรีณัฐ มีทองคำ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ประธานที่ประชุม
๒. นายสมศักดิ์ ณ มาตคำ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่	
๓. นายธนาวัฒน์ รุ่งอรุณกิจ	ผู้รับจ้าง บริษัท หมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด	
๔. นายรภัทสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์	ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๕. นายวิทวัส วงศ์เครือสร	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๖. นายพงศักดิ์ ถนอมเดช	คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๗. นายสังคม คัดเชียงแสน	นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	
๘. นายนิกร อินทะจักร์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น	
๙. นายกตติพันธ์ พรหมแก้ว	นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่	
๑๐. นางปัทมา ไชยพรหม	ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่	
๑๑. นางนภา นาคเจริญ	นักวิชาการพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่	
๑๒. นายอนุสรณ์ ชัยศิริ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่	
๑๓. นายวรรณไชย อุทัยชัย	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ	
๑๔. นายบุญสม ชุมวรรกร	ผู้ประสานงาน บริษัท หมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด	
๑๕. นายสุทธิวี ชมงานดี	ผู้ประสานงาน บริษัท หมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด	
๑๖. นางอุรา สมณา	เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน	

เริ่มประชุม

: เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายศรีณัฐ มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายศรีณัฐ มีทองคำ
รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน
ประธาน

: ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย โดยปรับปรุงระบบน้ำเสียและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำ บ้านรักไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท หมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างโครงการดังกล่าว วงเงินตามสัญญาจ้าง ๘,๑๓๒,๐๐๐ บาท

เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี ซึ่งต้องดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบกับบ้านรักไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นการติดตามเร่งรัด ความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดให้มีการประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม

: รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อพิจารณา

ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย โดยปรับปรุงระบบน้ำเสียและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท หมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างโครงการดังกล่าว วงเงินตามสัญญาจ้าง ๘,๑๓๒,๐๐๐ บาท

นายสมศักดิ์ ณ มาตคำ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหมอกจำแป่

: สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากช่วงระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างเป็นช่วงระยะเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวที่บ้านรักไทยเป็นจำนวนมากทางผู้ประกอบการและชาวบ้านรักไทยจึงขอระงับการก่อสร้างชั่วคราว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านรักไทย โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านรักไทยได้มีหนังสือแจ้งขอระงับการก่อสร้างชั่วคราวไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้ตามสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างเดิมได้สิ้นสุดลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างด้วยเหตุที่ให้ชะลอการก่อสร้างออกไปก่อนทำให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างไม่ได้สัญญาจ้างก่อสร้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และ อบต.หมอกจำแป่ ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้วในส่วนของการประชุมประชาคมได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านรักไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านรักไทย หมู่ที่ ๖ ตำบลหมอกจำแป่ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ นายจตุรงค์ อภิรดีศิริ ได้ประชุมประชาคมในหมู่บ้านรักไทยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เริ่มดำเนินการโครงการดังกล่าวในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงระยะเวลาในการก่อสร้าง โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทราบโดยทั่วกัน

นายธนาววัฒน์ รุ่งอรุณกิจ
ผู้รับจ้าง บ.หมูทอง
คอนสตรัคชั่น จำกัด

: บริษัท หมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ลงไปสำรวจพื้นที่ก่อสร้างปรากฏว่ามีพื้นที่ประมาณ ๕๐๐ เมตร ซึ่งเป็นไปตามแบบแปลน ส่วนอีกพื้นที่ประมาณ ๕๖๐ เมตรเป็นพื้นที่ซึ่งไม่มีดินจะเป็นพื้นที่ต่ำและเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านก่อสร้างบ้านเรือนและอาคารติดกับอ่างเก็บน้ำโดยหากจะทำการก่อสร้างจะต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกพร้อมกับเปิดน้ำออกให้แห้งในระดับที่สามารถก่อสร้างได้ ซึ่งงานทั้งหมดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตการก่อสร้าง และได้มีหนังสือส่งนายก อบต.หมอกจำแป่ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ แจ้งสาเหตุที่เข้าทำงานก่อสร้างไม่ได้เนื่องจาก

/๑. ชาวบ้าน...

๑. ชาวบ้านจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ติดกับอ่างเก็บน้ำออกพร้อมกับมอบพื้นที่ในเขตก่อสร้างยาวประมาณ ๕๖๐ เมตร
 ๒. หากทำการก่อสร้างโดยไม่รื้อถอนอาคารออกจะต้องก่อสร้างลงไปในพื้นที่อ่างเก็บน้ำโดยทำเสาเข็มตามหลักของวิศวกรรม
 ๓. หากทำการก่อสร้างตามข้อที่ ๒. จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
 ๔. จะต้องแก้ไขแบบแปลนซึ่งผิดจากแปลนที่ลงนามเซ็นสัญญาถึงจะมีการก่อสร้างได้
 ๕. จะต้องปรับแก้ราคาใหม่ให้สอดคล้องกับแบบแปลนที่แก้ไข
- ซึ่งบริษัทพร้อมดำเนินการตามสัญญาจ้างและหาทางออกแก้ไขปัญหาพร้อมกันได้

นายศรีณยู มีทองคำ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ประธาน : ข้อเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องของสัญญาจ้างระหว่าง บริษัท หมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด ในฐานะผู้รับจ้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ในฐานะผู้ว่าจ้าง ต้องพิจารณาร่วมกันแก้ไขปัญหาการส่งมอบพื้นที่และการแก้ไขแบบแปลน ซึ่งมีผลกระทบต่อสัญญาจ้าง เพื่อให้งานดำเนินการสำเร็จเป็นไปตามแผนงาน และระยะเวลาก่อสร้าง

นายสมศักดิ์ ฦ มาตคำ นายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลหมอกจำแป่ : ยินดีที่จะรับไปดำเนินการร่วมกันกับผู้รับจ้าง และประสานความร่วมมือกับชาวบ้านบ้านรักไทยและผู้ประกอบการ สำหรับการแก้ไขรูปแบบรายการของแบบแปลน หากกระทบไปโอนจัดสรรจะได้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

นายพงศ์ศักดิ์ แกมเดช คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน : ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้พึงระมัดระวังในการส่งมอบพื้นที่ให้เรียบร้อยมิให้เกิดเป็นข้ออ้างของผู้รับจ้างได้ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าของงาน

นายสมศักดิ์ ฦ มาตคำ นายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลหมอกจำแป่ : ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ได้เตรียมพื้นที่รองรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างไว้แล้ว

วิทวัส วงศ์เครือสร โยธาธิการและผังเมือง : การเปลี่ยนแปลงแบบแปลน เทคนิคงานก่อสร้าง ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองพร้อมที่จะช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่และผู้รับจ้าง

นายรภัสสิทธิ์ นิธิบุญเศรษฐ์ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน : การแก้ไขสัญญาจ้าง สามารถดำเนินการได้แต่ต้องไม่เป็นการเพิ่มวงเงินงบประมาณ และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

มติที่ประชุม

: ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้

๑. นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ และบริษัท หมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด ลงพื้นที่จริงเพื่อช่วยกันพิจารณา ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ปริมาณงานก่อสร้างและการแก้ไขสัญญา โดยให้ โยธาธิการและผังเมืองให้คำปรึกษาแนะนำ
๒. การแก้ไขสัญญาจ้างขอให้คลังจังหวัดให้คำแนะนำเพื่อสามารถดำเนินโครงการได้
๓. หากกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างภายหลังจากลงนามในสัญญาจ้าง แล้วให้ถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๖๑ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี
๔. โครงการดังกล่าวจะต้องดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและเร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จึงให้องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทยฯ ให้นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนทราบเป็นระยะ เพื่อรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ฮ่องสอนทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

: เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดประชุม

เลิกประชุม

: เวลา ๑๔.๓๐ น

ลงชื่อ




ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายนิกร อินทะจักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายรภัทสิทธิ นิธิบุญเศรษฐ์)

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
